

赤い羽根共同募金事業報告

事業名	吉川つばさ保育園外部改修工事
事業実施時期	2022年5月28日から2022年7月20日
(事業概要説明) 2007年に建築し14年が経過し、屋根や外壁のガルバ鋼板自体の保証は通常10年の為塗装面の劣化が進んでいます。また外壁の小波ガルバ鋼板の通常保証は有っても小波鋼板工法保証は5年でありビスの浮き等が著しく漏水し、下地の腐食に繋がる所も一部あることが昨年 of 園舎増築時に確認できました。漏水や劣化を防ぎ園舎の維持には、早急にビスを長いものに取替え前面塗装する外部修繕が必要と判断し計画致しました。赤い羽根共同募金の助成金を受けることが出来ました。	

【資金内訳】

<事業実施の財源>	金額	
自主財源	2,170,000 円	
赤い羽根共同募金助成金	3,000,000 円	
計	5,170,000 円	



No. 10

撮影日 2022/6/3~7

摘要

屋根ケレン



No. 11

撮影日 2022/6/3~7

摘要

屋根ケレン



No. 12

撮影日 2022/6/3~7

摘要

屋根ケレン



No. 7

撮影日 2022/5/29

摘要

屋根洗浄



No. 8

撮影日 2022/5/29

摘要

外壁洗浄



No. 9

撮影日 2022/5/29

摘要

外壁洗浄



No. 13

撮影日 2022/6/8~10

摘要

外壁ビス廻りケレン

ビスを浮かしてケレン



No. 14

撮影日 2022/6/8~10

摘要

外壁ビス廻りケレン



No. 15

撮影日 2022/6/8~10

摘要

外壁ビス廻りケレン

部分的にビスを取り
ケレン



No. 16

撮影日 2022/6/10~22

摘要

外壁ビス取替え

既存より太く長いビスとし
パッキン付とする



No. 17

撮影日 2022/6/10~22

摘要

外壁ビス取替え



No. 18

撮影日 2022/6/10~22

摘要

外壁ビス取替え

取替えビス仕様

パッキンビス

4.3φ x 35mm



No. 19

撮影日 2022/6/13~23

摘要

関西ペント

屋根 錆止塗布材

IP水性メタルコート錆止め

納品



No. 20

撮影日 2022/6/8~16

摘要

関西ペント

屋根 錆止塗布

IP水性メタルコート錆止め

塗布



No. 21

撮影日 2022/6/8~16


摘要

関西ペント

屋根 錆止塗布

IP水性メタルコート錆止め

塗布

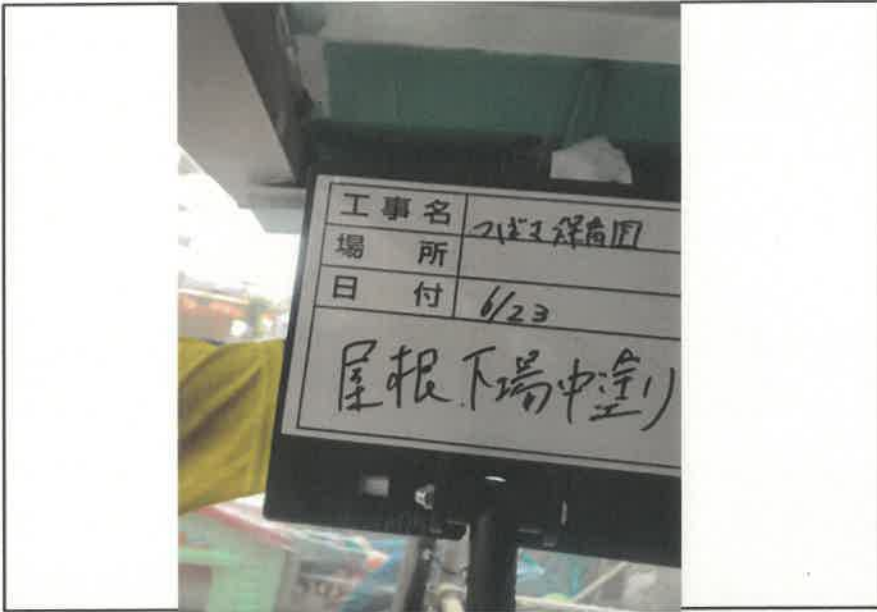

No. 34


撮影日 2022/6/23

摘要

折版軒裏

中塗り

折版部一ロクシヨウ

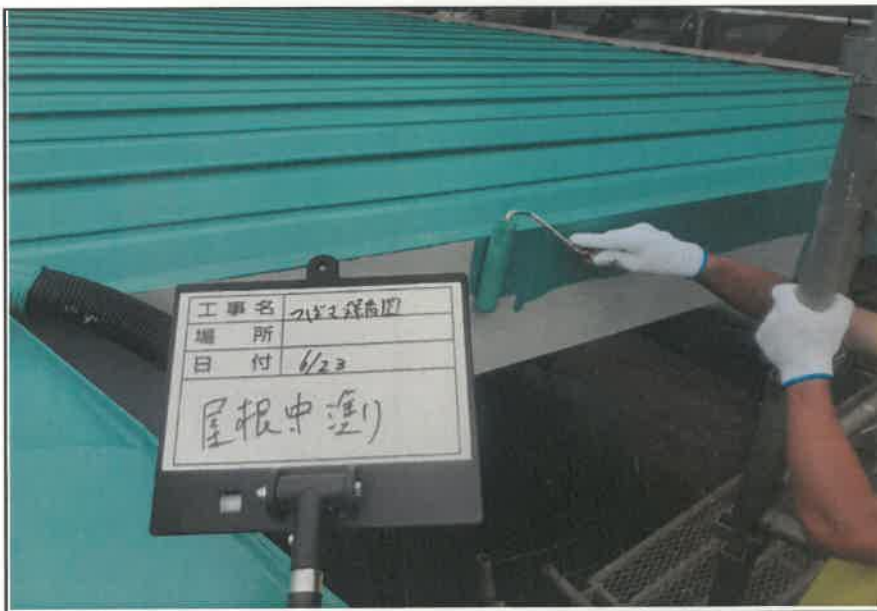

No. 35


撮影日 2022/6/20~25

摘要

屋根

中塗り

折版部一ロクシヨウ

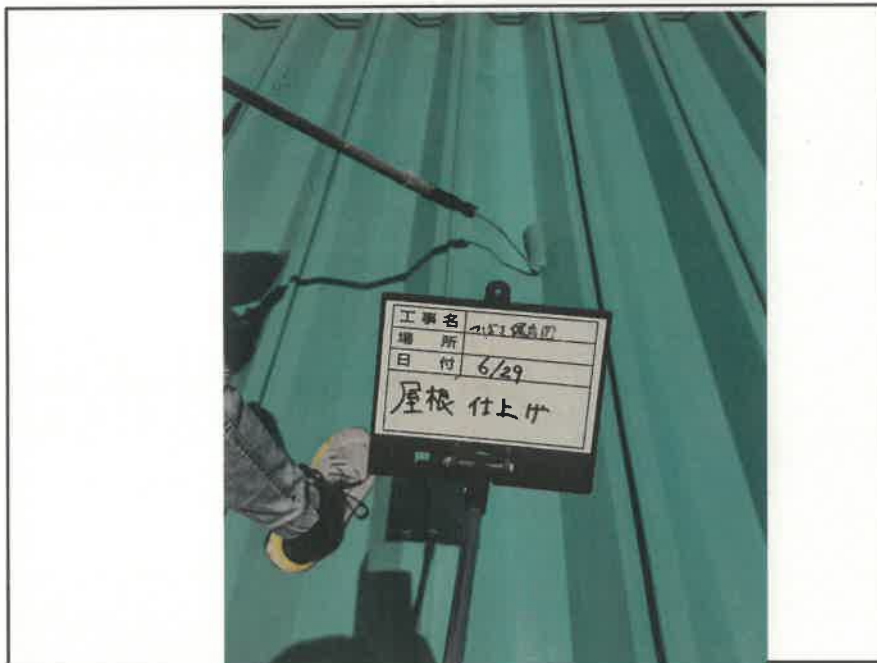

No. 36

撮影日 2022/6/27~30

摘要

屋根 折版

上塗り(仕上)
